# GEN/FBE03 Version 12

7	
=	DDAA
=	POIVI
-	groupe

1164-CPR-ESC011

1164-CPR-ESC007

### BORDEREAU DE PLANS ET DEMANDE D'ACCORD POUR FABRICATION

			-11070							
N°Affaire : <b>201803</b> 5	70 Client	/ Chanti	er: PIERRE	B. SAS / 88/	Logeme	ents/10 logts /	CHAUMOUSS	EY		
E	Expéditeur : MARINA.GALABRUN				Destinataire : M COLIN					
T	Téléphone :			Téléphone : 0						
N	Лаіl : marina.galabr	un@pbm	.fr	Mail : noel.co	olin.pierr	eb@orange.fr				
N	Nombre De Pages (Bordereau de plan inclus) :									
	ate : mercredi 17 o	ctobre 20	18							
		BODI	DEDEALLOED	LANCAIS, 4 :	0	- CONT. N				
N° plan coffra	ge P1-0	T	DEKEAU DE P	LANS N°: 1 indi	ce: 0		Г	т		
N° plan coffra N° plan Ferrailla		<b>P2-0</b>						+		
Quantité	2	1		_				+		
Quantite					1					
N° plan coffra	ge				I			T		
N° plan Ferrailla	age									
Quantité										
Elévation	A-1-RA	-								
Implantation										
Autres										
REMARQUES :  Pour permettre la mi  Adresse précise de livraise  Conducteur de travaux : N  Téléphone : 03.29.31.56.3  Mail : noel.colin.pierreb@  Le chantier est-il équipé d  Horaires du chantier : 7h3	on: RUE GAL LECLERC On COLIN Orange.fr 'une grue?: Oui	INFORMA informat	ATIONS A FOU	JRNIR PAR LE C us doivent être v Chef de chantie Téléphone :	vérifiées,	CORRIGÉES ET/OU CO DUPONS FO. 49. 20 29. 39. 42 ILE MODILE?: OC	D - Dib 0.12 7.73			
Commentaires :	PLAN	S et ACC	ORD à nous re	envoyer par FA	X ou par	MAIL				
A					<b>S</b> (19-11)					
Fax: 03 8	0N 3 72 43 09 8 72 43 09 deric.simon@pbm.f	r		Date:  Nom:  Nom:  Nom:  Visa + tampon:  S.A.S. PIERRE B.  Vous recevrez sous peu la fiche d'information client du vois unit conniers ealisant votre commande  SECTION NOM:  SA.S. PIERRE B.  Vous recevrez sous peu la fiche d'information client du vois unit conniers ealisant votre commande  SECTION NOM:  13 rue des Chautronniers ealisant votre commande  SECTION NOM:  14 TONNOM:  NOM:  NOM:						
Déclarations	s des performance	es dispon	ibles sur no	tre site <u>www.</u>	pbm.fr c	ou sur simple dei	mande			
C				ués en bétoi	***		NE			
PBM 13	PBM 3			M 53		PBM 71	PBM 7	7		

1164-CPR-ESC003

1164-CPR-ESC008

1164-CPR-ESC002

# **ELEVATION SCHEMATIQUE**




Repère Indice Modèle Livraison Souhaitée Indice Modèle Livraison Souhaitée Indice Livraison Souhaitée

# S.A.S. PIERRE B.

13 rue des Chaudronniers

88190 GOLBEY

SURET 328 788 419 00039 - APE 4120 B T6l. 03 29 31 56 32 - Fox. 03 29 39 47 73

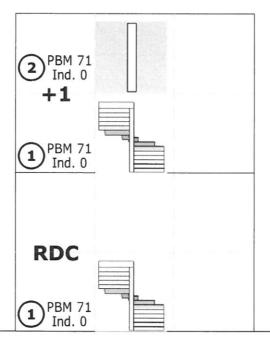


 BATIMENT: A
 CAGE: 1
 Aff: 201803570

 PIERRE B. SAS


 CCial: SIMON Frederic
 Nom: GALABRUN Marina
 88/Logements/10 logts /CHAUMOUSSEY

 Tel: 03 88 72 32 98
 Date: 17/10/2018

SEN/FBE04 Version

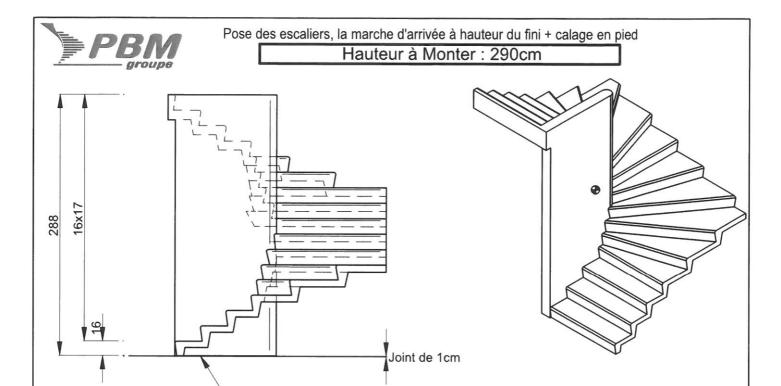

Reprise en forme de pente 1cm pour HAM

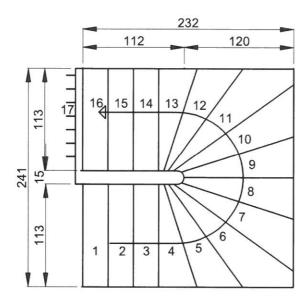

Escalier Hors Gabarit pour le passage du brancard (passages inférieurs à 120cm fini)

> GIRON < 28 cm à 50 cm des murs extérieurs (pour cage fini 245 x 236) HORS NORMES PMR

# S.A.S. PIERRE B.

13 rue des Chaudronniers 88190 GOLBEY


SIRET 328 788 419 00039 - APE 4120 8 Tel. 03 29 31 56-32 - Fext. 03 29 39 47 73

Afin d'éviter toute contestation, ces plans doivent être approuvés par la MO, le BC et le BE Bureau Méthodes Quantité Vérifier par :M.GALABRUN BPE 2 Date: 17/10/2018 Balancé à Fût - 15\*112 V2 Ferraillage: Standard Ordonnancement Usine Vérifier par : INDICE 1 Echelle: Aff: 201803570 Date: 1/40 Atelier Mécanique PIERRE B. SAS Nez : Arrondi Aspect : Gris - N°: Nb marche: 17 Vérifier par : 88/Logements/10 logts /CHAUMOUSSEY Option: Aucune Date: Ht marche: 17 Rot : G Finition : Lisse non glissant Giron: 28 Atelier Béton Levage : Cablettes de levage Vérifier par : Cage: 245 x 236 Escalier Intérieur Date: Bat A A CCial: SIMON Frederic Classe-d'exposition: XC1 - B Chargement Poids: A = 3070 Kg Surcharge 400 Kg/m² Cage 1 1 Nom: GALABRUN Marina Vérifier par : Niv 0 1 Date: 17/10/2018 Date: Usine: PBM 71






# Armature: BALANCE A FUT 15\*112

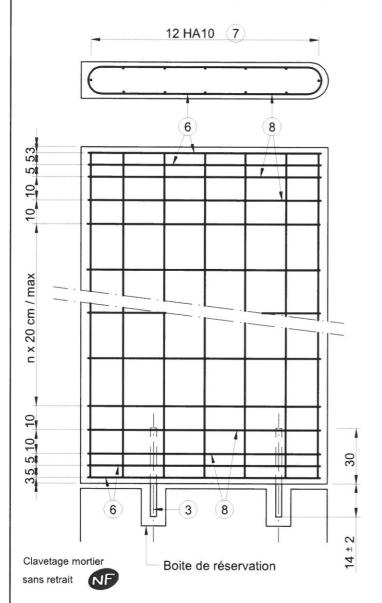




## Section à l'arrivée



# Section courante

		Nomenclat	ure
		SURCHARG	
		Répartie = 400 Ponctuelle = 200 k	•
	1	Variable	HA 10 Lsi = 36 cm
	2	Variable	HA 6
	3	45	HA 32
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	e=15	HA 6	
Kep	5	Variable	HA 10
	6		HA 10
	7	Longueur fût - (enrobage x 2)	HA 10
	8		HA 6



S.A.S. PIERRE B.

13 rue des Chaudronniers 88190 GOLBEY

Date: 17/10/2018

SIRET-328 788 419 00039 - APE 4120 B
Tel. 03 29 31 56 32 - Fax. 03 29 39 47 73


Hypothèses de ca	Icul retenues :			
Classe d'exposition : XC1 à XC3 + XF Condition d'environnement : B et C	Résistance minimale des acier			
BETON C30/37 : f <sub>ck</sub> = 30 MPa	Acier HA FeE500			
Enrobage nominal: 20 mm	Limite d'élasticité : f <sub>yk</sub> = 500 MPa			
Ouverture des fissures : 0.30 mm	Résistance ultime à la traction : ftk = 515 MPa			
Recouvrement: 41 Ø mini	Acier DX FeE235 : f <sub>ik</sub> = 235 MPa			

Aff : 201803570	(1)
PIERRE B. SAS	
88/Logements/10 logts /CHAUMOUSSEY	
CCial : SIMON Frede	eric
Nom: GALABRUN M	larina




Pose des escaliers, la marche d'arrivée à hauteur du fini + calage en pied

Hauteur à Monter : 100cm



NOTA : Rehausse pour garde-corps, pas de réservations





13 rue des Chaudronniers 88190 GOLBEY

SIRFT 328 788 419 00839 - APE 4120 8 T4L 03 29 31 56 32 - Fax. 03 29 39 47 73

Afin d'éviter toute contestation,	ces plans	doivent être	approuv	vés par la l	MO. le BC	et le BE				
Bureau Méthodes Vérifier par :M.GALABRUN Date: 17/10/2018				Quantit						
Ordonnancement Usine	Fût Balancé - 15*112							Ferraillage: Normal		
Vérifier par : Date :	INDICE	А	В	С	D	E	F	Echelle:	Aff : 201803570 (2)	
Atelier Mécanique Vérifier par : Date:		arche: 0			Nez : Vif Option : .	Aucune	•	1/30 Gris - N°:	PIERRE B. SAS 88/Logements/10 logts	
Atelier Béton Vérifier par : Date :	Giron: 0 Rot: Cage: 0 x 0			οι. <sub> </sub>	Finition : Lisse non glissant Levage : Cablettes de levage Escalier Intérieur				/CHAŬMOUSSEY	
Chargement	Bat A	$\overline{}$	$\perp$		Classe-d'exposition: XC1 - B				CCial : SIMON Frederic	
Vérifier par : Date :	Cage 1 Niv 1			F	Poids: 410 Kg Surcharge: 400 Kg/m²				Nom: GALABRUN Marina	
Duto.	INIA						Usine	: PBM 71	Date: 15/10/2018	
